

平成25年度第1回雨水排水対策協議会

多治見市浸水対策進捗管理個表

平成25年5月28日

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-1	河川整備計画の立案	多治見市道路河川課、下水道課	多治見市内の準用河川及び普通河川の整備

着 工 前	完 成
-------	-----


年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	姫川、大原川、辛沢川各流域の支流河川の整備計画業務を発注し2月 姫川委託設計完了 3月 大原川、辛沢川委託設計完了	100	完 了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容	
河-2	都市計画と 河川施設との調和	多治見市都市政策課	河川整備と多治見市都市計画の調整	
		遅延理由	堤防整備の具体案が検討中であったため	
		対策	平成25年度に具体的な計画が示された時点で調整を図っていく	
年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	具体的な計画案が示されていないため未調整	0	未着手	具体的な計画案が示された時点で調整を図る
25				
26				
27				
28				
29				


No.	施策名称	事業主体	主な事業内容	
河-3	都市計画と河川施設との調和	国土交通省庄内川河川事務所	河川整備と多治見市都市計画の調整	
		遅延理由	景観(桜)に配慮した堤防整備を行う必要があるため	
		対策	平成25年度に堤防嵩上げの具体案を作成し、計画調整を進める	
年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	堤防嵩上げの方策について概略検討	10	予定より遅れている	堤防嵩上げの具体案を作成し調整を図る(平和町1丁目、4丁目)
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-4	脇之島川の合流処理	国土交通省庄内川河川事務所	準用河川脇之島川の合流点処理

着
工
前

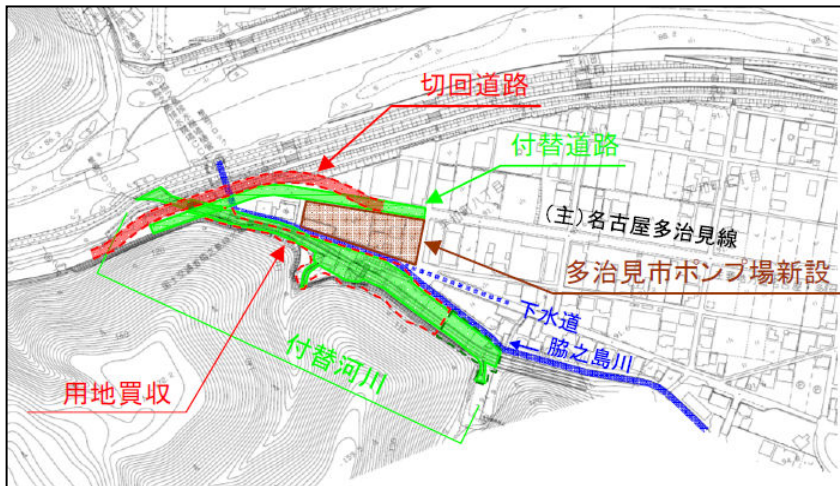

完
成
イ
メ
ー
ジ

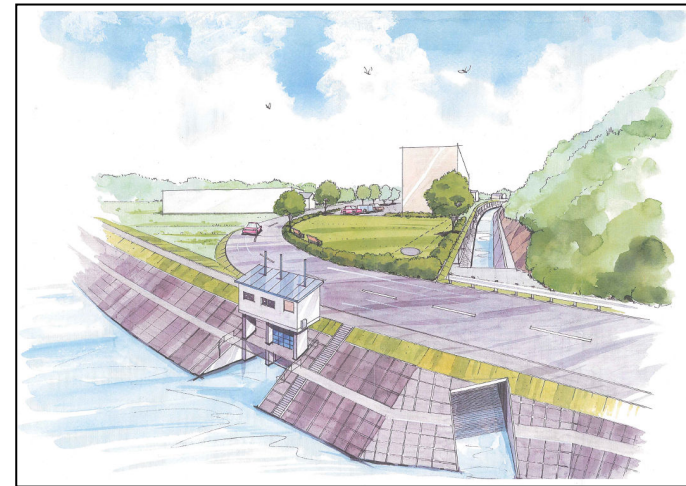


年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	<ul style="list-style-type: none"> 河川法手続(附帯工事) 予備・詳細設計 用地調査 	4	予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> 用地買収 切り回し道路
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-5	脇之島川の整備	多治見市道路河川課	準用河川脇之島川中上流部の改修工事

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">着工前</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">一部完成</div> 
---	--

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	11月 H=50cm、L=145.5mの特殊堤設置完了 3月 事業認可取得	2	予定より進んでいる	測量、土質調査、基本詳細設計の実施
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-6 ①	土岐川の水位低下対策	国土交通省庄内川 河川事務所	一級河川土岐川の砂洲の除去

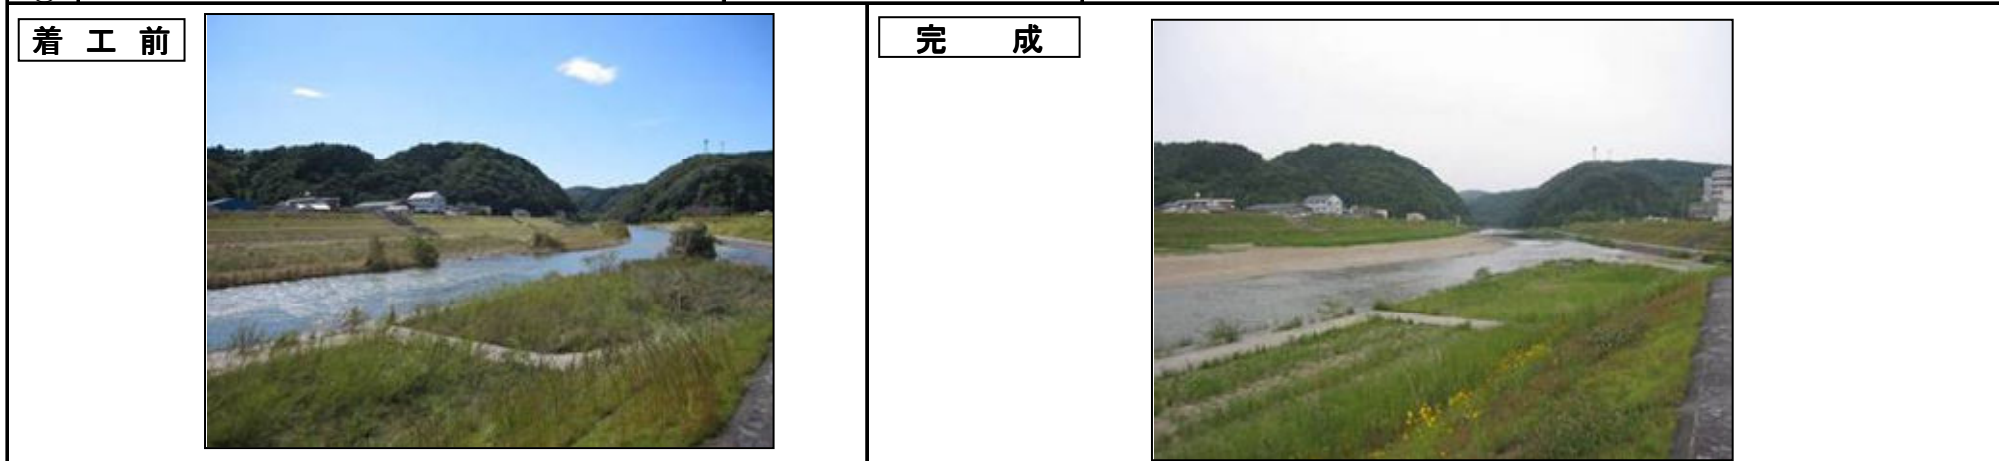

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	平和工区(国長橋下流左岸) 8,300m ³ 月見工区(辛沢川合流点) 1,000m ³	100	完 了	
25				
26				
27				
28				
29				


No.	施策名称	事業主体	主な事業内容	
河-6 ②	土岐川の水位低下対策	国土交通省庄内川河川事務所	一級河川土岐川と一級河川大原川の合流点の砂洲の除去	
		遅延理由	近接工事との調整が必要なため	
		対策	平成25年度に右岸側約1,500m ³ の掘削を行う	
年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	平成23年度に左岸側300m ³	20	予定より遅れている	右岸側約1,500m ³ の掘削
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-6 ③	土岐川の水位低下対策	国土交通省庄内川 河川事務所	土岐川狭窄部の拡幅改良

着工前	完 成
-----	-----

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	掘削区間の測量	1	予定より進んでいる	平成27・平成28年度の掘削箇所及び掘削量等についての設計及び計画協議等
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ①	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川の河床掘削

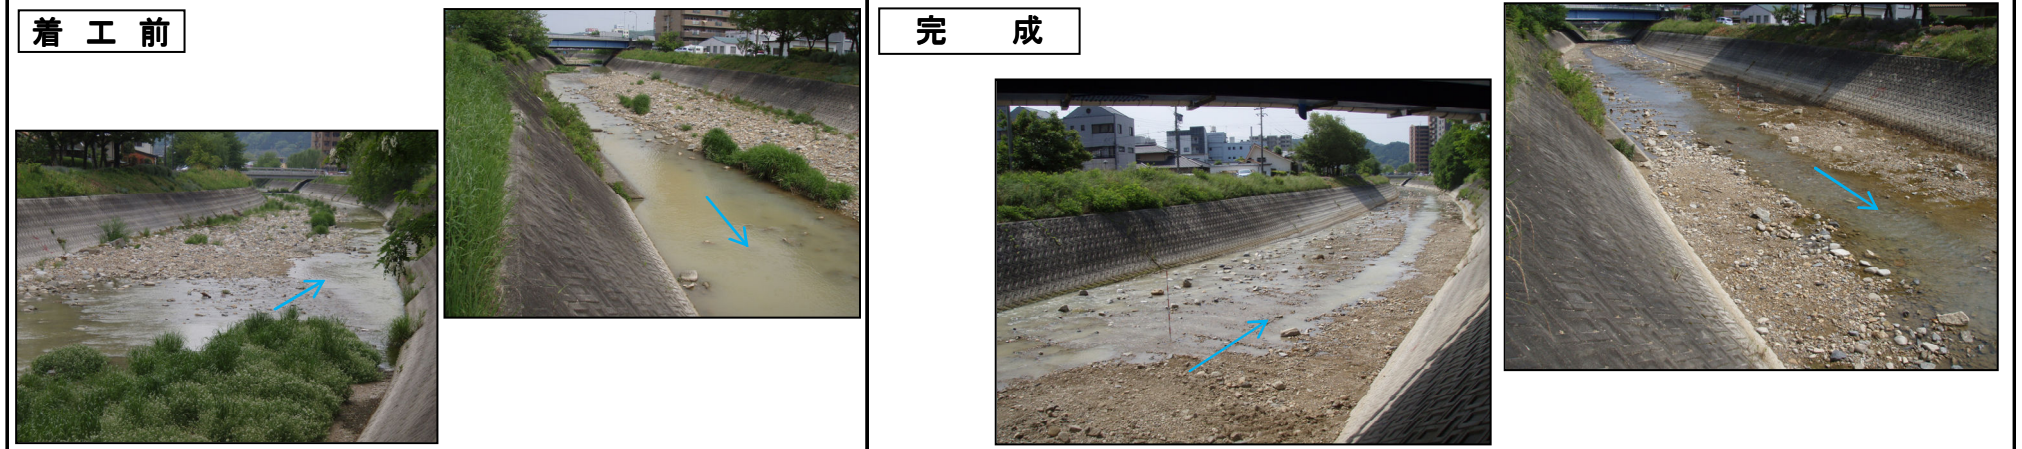


年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	4月 工事着手 6月 工事完了	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ②	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川の砂洲の除去



年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	4月 工事着手 6月 工事完了	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ③	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川の余裕高部に張りブロックを設置

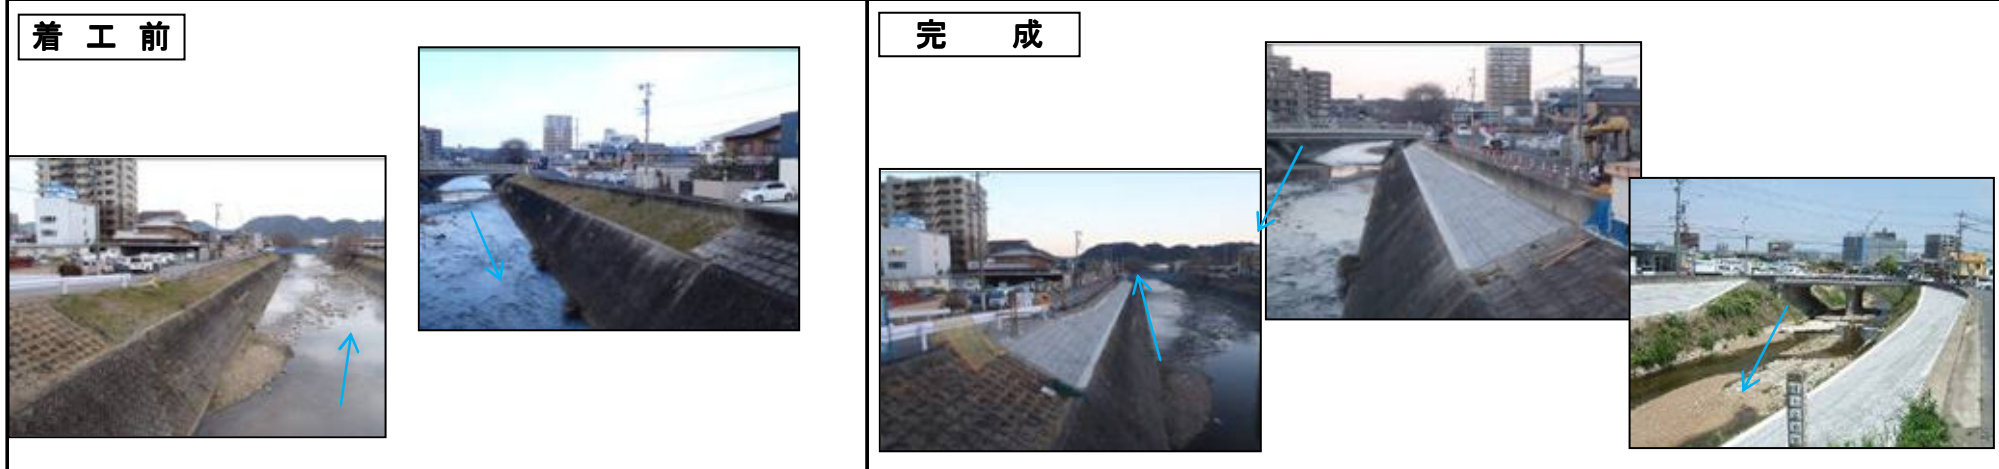

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	9月 工事着手	40	予定どおり	JR橋梁付近、野中橋～国道19号までの間を実施 平成25年度末完了予定
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ④	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川のパラペットの設置及び嵩上げ







年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	9月 工事着手	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ⑤	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川河川内にあるニセアカシア等の雑木の除去



年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	9月 工事着手 3月 工事完了 (桜は、伐採しない)	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ⑥	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川の特殊堤に設置されている逆流防止弁の定期清掃及び点検

<p>着 工 前</p>  	<p>完 成</p>  
---	---

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	4月 工事着手 5月 工事完了	100	完了	次年度以降は、定期的に確認し、清掃を実施する
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-7 ⑦	大原川の越水対策	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川大原川の法裏ブロックの設置(排水ポンプ対策)




年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度取組予定内容
24	9月 工事着手	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-8 ①	辛沢川の修繕	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川辛沢川の堆積土砂撤去




年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	4月 工事着手 6月 工事完了	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-8 ②	辛沢川の修繕	岐阜県多治見土木事務所 河川砂防課	一級河川辛沢川の特設堤の嵩上げ

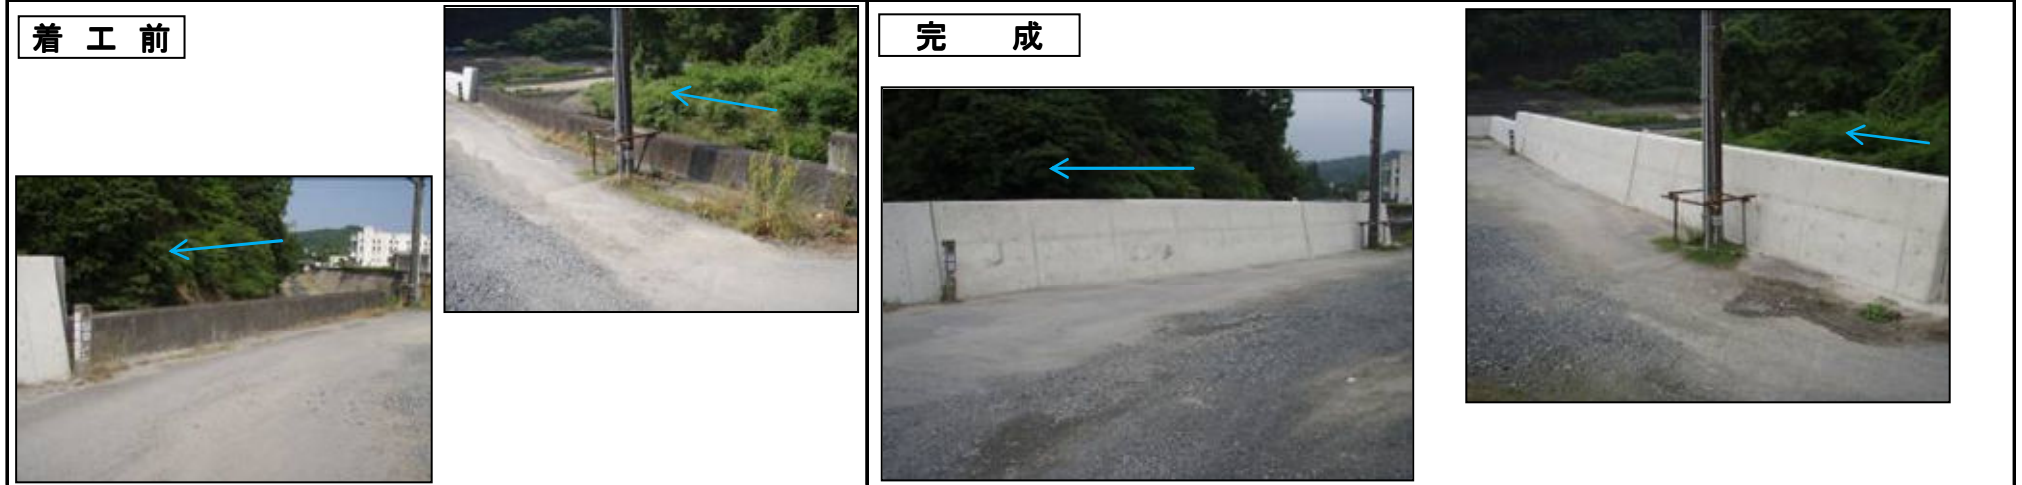

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	4月 工事着手 6月 工事完了	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-8 ③	辛沢川の修繕	国土交通省庄内川 河川事務所	一級河川辛沢川の特設堤の嵩上げ

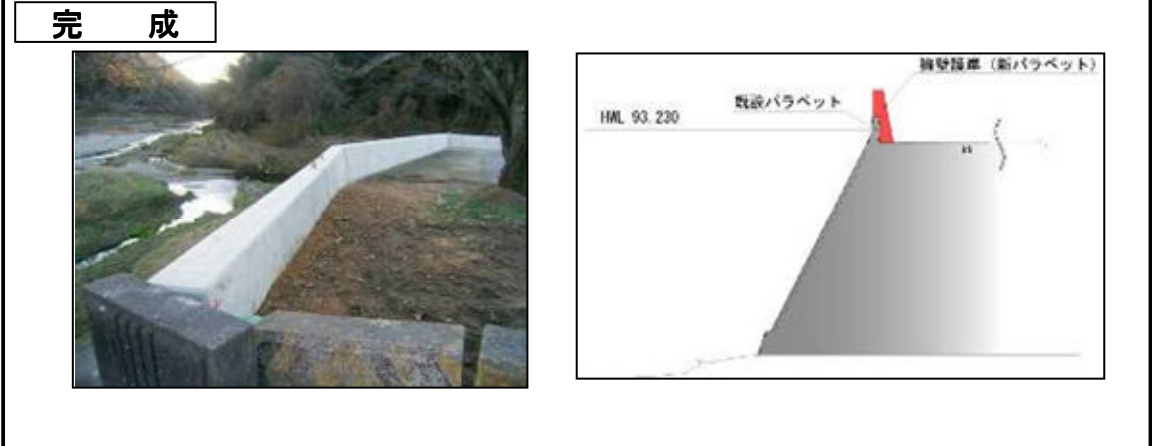

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	平成23年度施工済み	100	完了	
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-9	観音寺川の改修	多治見市道路河川課	普通河川観音寺川の屈曲部の改修

着工前	完成

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	3月 河川改修の委託設計を発注し概略設計を完了	8	予定どおり	詳細設計を実施し、用地買収の協議を実施
25				
26				
27				
28				
29				

No.	施策名称	事業主体	主な事業内容
河-10	河川改修・排水路改良	多治見市道路河川課	一級河川大原川に流入する普通河川の改修計画を立案する

着工前

完成

年度	年度末における取組状況	進捗率(%)	進捗状況	次年度の取組予定内容
24	酒井田川・根本川付近の浸水箇所に対する設計業務の発注	5	予定より進んでいる	詳細設計の実施 酒井田川付近の浸水箇所の工事を実施
25				
26				
27				
28				
29				
