案

中京学院大学プロジェクト

アクションプラン

令和8年2月策定

多治見市

１ 策定の背景及び目的

令和９（2027）年４月、中京学院大学（以下、「ＣＧＵ」）は、キャンパス及び法人本部を本市に移転一元化します。

ＣＧＵの移転開学により、学生 555 人及び教職員 150 人（2025 年時点）が本市にやってきます。また、「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を建学の精神とするＣＧＵは、経営・看護・保育の学部科を有するとともに、硬式・軟式野球部や卓球部等全国的に強豪として知られるスポーツクラブを有しており、多様な人財が地域で活躍することが期待されます。

本プランは、当市の活性化に資するこうした見込みや期待を実現・実感できるよう、移転開学までに当面実施すべき事業をとりまとめ、このＣＨＡＮＣＥ（チャンス）をＣＨＡＮＧＥ（チェンジ）にいかにつなげていくかを市民・ＣＧＵ・市が共有するために策定します。

２ “CHANCE”を“CHANGE”に！

① 交流人口の増加
(1) 学生 555 人⇒定員 1,000 人充足目標
(2) 教職員 150 人

② 定住人口の増加
入学者 150 人の半分が県外出身者

③ 経済波及効果
(1) 令和９年（移転初年度）　47 億円
(2) 令和 10 年度以降　毎年 18 億円

CHANCE

④ エッセンシャルワーカーの輩出
(1) 看護学部　Ｒ７卒業生　58 人
(2) 保育科　Ｒ７卒業生　38 人

⑤ スポーツクラブ所属学生　250 人

⑥ 外国人留学生　18 人⇒100 人超方針

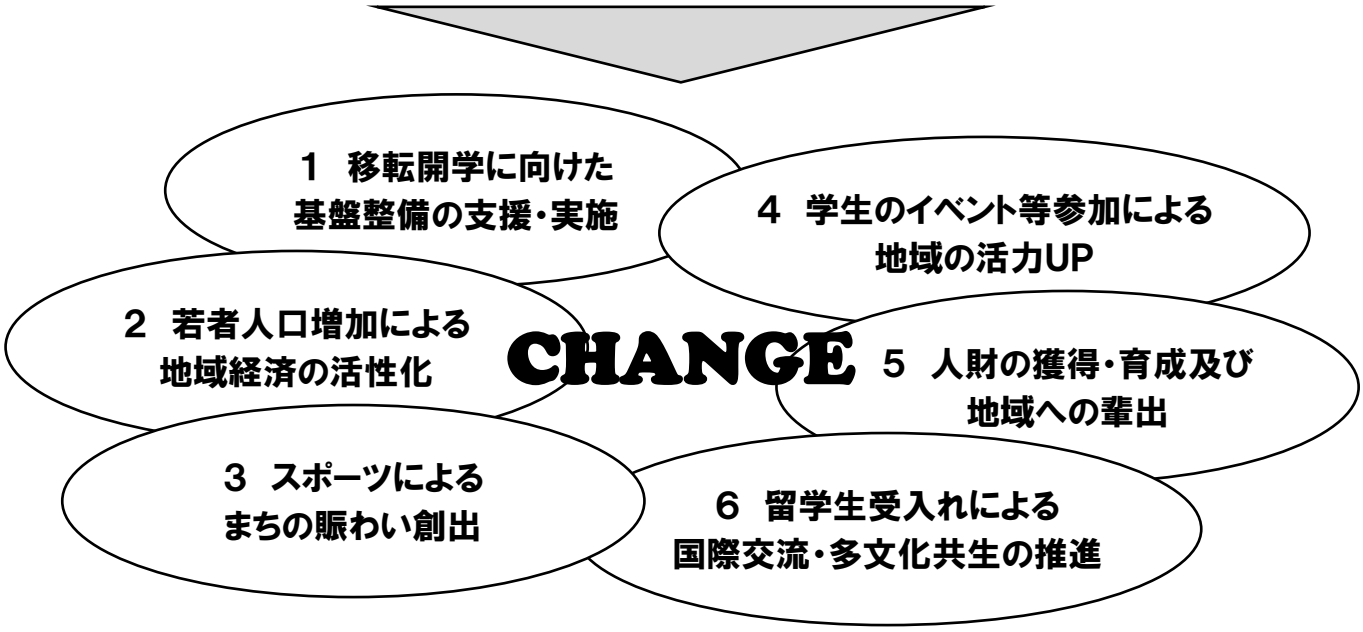

３ CGU連携取組事業一覧

ＣＧＵの移転開学により期待される変革を６項目に整理し、ＣＧＵと本市が連携・協働して 25 の事業を実施します。

1 移転開学に向けた基盤整備の支援･実施

ＣＧＵキャンパスの整備、公共交通による通学・通勤需要への対応やスポーツクラブの利用を見据えた市スポーツ施設改修の実施等により、移転開学を支援します。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
1	**ＣＧＵキャンパスの整備支援**	企画政策課／教育総務課
	笠原中学校建物及び土地並びに准看護学校建物をＣＧＵに譲渡し、キャンパス整備を支援します。	
	R7　①測量、鑑定評価、登記等の実施 ②キャンパス整備に係る補助金交付 R8　①笠原中学校及び准看護学校建物の譲渡（土地は貸付） ②測量、鑑定評価、登記等の実施 ③キャンパス整備に係る補助金交付 R9　①笠原中学校土地の譲渡 ②キャンパス整備に係る補助金交付	
2	**ＣＧＵへのバス路線の新設・再編**	都市政策課
	交通事業者との協議、道路管理者（県）及び公安委員会との調整により、通学・通勤需要に対応したバス路線を新設・再編します。	
	R7　協議（ダイヤ、運賃、乗降方法、ＤＸ決済等）及び敷地内右折進入に係る関係機関との調整 R8　地域公共交通会議及び運賃協議会に付議 R9　運行開始	
3	**市スポーツ施設の改修整備**	文化スポーツ課
	スポーツクラブが利用する市有施設について、安全性及び利便性の向上を目的とした改修整備を実施し、全ての利用者がより安全・快適に利用できる環境を整えます。	
	R7　ＣＧＵとの協議及び実施内容の検討・調整 R8　滝呂球場及び向島運動広場の改修整備 R9　供用開始	
4	**ＣＧＵへの職員派遣による連携強化**	人事課／企画政策課
	移転開学に向け、市職員をＣＧＵに１名派遣し、ＣＧＵ事務局との連携を強化します。	
	R7　①市職員派遣に係るＣＧＵとの調整 ②事務レベル・トップレベルの協議による連携事業の検討・実施 R8　①市職員の派遣 ②事務レベル・トップレベルの協議による連携事業の実施・確認	

2 若者人口増加による地域経済の活性化

ＣＧＵの移転開学により、最大で昼間人口 1,000 人、市内居住者 600 人の増加が見込まれます。この機会を地域経済に新たな活力をもたらす起爆剤とします。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
5	**ＣＧＵウエルカム事業の実施**	企画政策課
	移転開学の機運を醸成するとともに、本市にやってくる学生を対象とした経済活性化事業を実施します。	
	R7　実施内容の検討・調整 R8　①ＣＧＵウエルカム看板の設置 ②地域経済活性化事業の実施	
6	**ＣＧＵ学生向け賃貸住宅の整備支援**	企画政策課
	学生向け賃貸住宅の整備を検討する事業者向けのセミナーをＣＧＵと共同開催し、情報提供を行います。	
	R7　事業者向けセミナーの開催 R8　情報提供の継続実施	

3 スポーツによるまちの賑わい創出

日本代表選手の輩出や全国大会優勝の実績を誇るＣＧＵスポーツクラブと連携し、子どもたちや競技団体、地域とのスポーツを通じた交流により、まちの賑わいを創出します。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
7	**子ども向けスポーツ教室の実施**	文化スポーツ課
	ＣＧＵスポーツクラブ及び市スポーツ協会と連携し、子ども向けスポーツ教室を実施します。	
	R7　実施内容の検討・調整 R8　スポーツ教室事業開始 R9　スポーツ教室事業継続（対象・回数の拡大）	
8	**ＣＧＵスポーツクラブの市施設利用**	文化スポーツ課
	ＣＧＵスポーツクラブが活動で市スポーツ施設を円滑に利用できるよう、市スポーツ協会と連携して各種競技団体と調整します。	
	R7　各種競技団体との調整 R8　各種競技団体との調整 R9　ＣＧＵスポーツクラブの利用開始	
9	**【経営学部連携】** **ＡＣＰ（アクティブチャイルドプログラム）の実施**	教育研究所
	市内モデル校において、学生が子どもに対して運動遊びを教えるＡＣＰを実施します。	
	R7　実施内容の検討・調整 R8　モデル校の選定、実施内容の具体的検討・調整 R9　モデル校におけるＡＣＰ実施	

10	**ＣＧＵ新設スポーツクラブの支援** ＣＧＵが令和９年４月に新設を予定するサッカークラブについて、クラブの活動が円滑に行われるよう支援します。 R7　新設されるサッカークラブに関する情報共有 R8　サッカークラブの活動場所に関する検討・調整 R9　①ＣＧＵによるサッカークラブの新設 ②サッカークラブの活動場所に関する検討・調整	文化スポーツ課／企画政策課

4 学生のイベント等参加による地域の活力UP

ＣＧＵ学生が、本市イベント・事業に多様な形態で参加します。若い力やアイデアを取り入れることで、地域の活性化を目指します。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
11	**【経営学部連携】** **ビジネスイベントへの学生参加** 本市ビジネスイベントにＣＧＵ学生が参加し、イベントの活性化及び地元企業への理解を促進します。 R7　ＣＧＵによる本市ビジネスイベント視察 R8　企業お見合いＣＧＵ参加 R9　き業展へのＣＧＵブース参加	商工観光課
12	**【経営学部連携】** **課題解決型学習（ＰＢＬ）、経営者ワークショップの実施** 学生が企業に赴き課題解決能力を養う学習（ＰＢＬ）や、地元経営者によるワークショップを実施し、産学官連携を推進します。 R7　方針の検討・調整 R8　①ＰＢＬ連携企業の選定 ②経営者ワークショップ詳細検討 R9　①市内企業におけるＰＢＬ実施 ②経営者ワークショップ実施	商工観光課
13	**【看護学部連携】** **健康づくり事業や母子保健事業の連携実施** 学生がウォーキングイベント及び母子保健事業の企画・運営を補助し、連携して事業を実施します。 R7　ＣＧＵ学生が参加するウォーキング事業実施 R8　①ＣＧＵ学生が企画・運営補助するウォーキング事業実施 ②母子保健事業の連携検討開始 R9　継続実施（質の向上）	保健センター

14	**【保育科連携】** **公立保育園・幼稚園、発達支援センター及び児童館における連携実施** 学生が各園やセンター等で開催するイベントの企画・運営を補助し、連携して事業を実施します。 R7　実施内容の検討・調整 R8　ＣＧＵ学生が企画・運営補助するイベント等事業実施 R9　継続実施（質の向上）	保育幼稚園課／こども家庭課
15	**【看護学部、保育科連携】** **たじみこどもフェスタへのブース出展** たじみこどもフェスタに看護学部及び保育科がブース出展し、イベントの活性化及び地域住民・子どもたちとの交流機会を創出します。 R7　たじみこどもフェスタに看護学部及び保育科ブースを出展 R8　継続実施（質の向上） R9　継続実施（質の向上）	こども家庭課
16	**ＣＧＵ学生消防団の創設支援及び地域防災連携の推進** ＣＧＵ学生消防団の創設を支援します。また、防災に関するＣＧＵと地域との連携した取組を推進します。 R7　学生消防団創設の検討及びＣＧＵとの調整 R8　①学生消防団創設の支援 ②ＣＧＵとの地域防災連携に関する検討 R9　①学生消防団の創設 ②ＣＧＵとの地域防災連携の実施	消防総務課／危機管理課

5 人財の獲得･育成及び地域への輩出

将来の東濃地域を担う人財をＣＧＵが育成・輩出できるよう、入学生の獲得や実習・就職に向けた支援を行います。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
17	**ＣＧＵ入学生獲得支援** オープンキャンパスや進路相談会等のＣＧＵ入学生獲得活動を支援します。 R7　オープンキャンパス、進路相談会の市施設における共催実施 R8　継続実施 R9　継続実施	企画政策課

18	**市内病院・クリニックにおける実習及び就職支援** 市内病院・クリニック等と連携し、看護学部学生の実習及び就職支援を実施します。 R7　実施内容の検討・調整 R8　①出前講座実施 ②在宅看護実習に向けた協議 R9　継続実施	保健センター
19	**市内公立園におけるボランティア受入れの実施** 市内公立保育園・幼稚園における保育学科学生の有償・無償ボランティアの受入れを行い、学生が保育に親しむ機会を創出します。 R7　ＣＧＵ保育学科学生のボランティア実施に向けた検討 R8　連携事業開始 R9　継続実施	保育幼稚園課
20	**ＣＧＵと医療機関が協力して医療人財を育成する体制の確保** エッセンシャルワーカーの本市及び東濃地域への定着を目指し、ＣＧＵと市内病院等の連携強化を支援します。 R7　ＣＧＵと市内病院の連携研究 R8　継続実施 R9　継続実施	企画政策課
21	**保育士・幼稚園教諭の育成及び活躍に関する連携の推進** ＣＧＵと市が連携して保育科学生を育成し、市内での活躍（就職）を促すことで、市の保育サービス・幼児教育の質の向上を目指します。 R7　ＣＧＵと「こども未来応援パートナーシップ」協定を締結 R8　協定に基づく保育実習等の人財育成事業及び採用活動の実施 R9　継続実施	保育幼稚園課／人事課
22	**ＣＧＵ卒業生の地域への就職・定着支援** ＣＧＵを卒業した人財が地域に就職・定着するよう、ＣＧＵと商工会議所の連携を支援します。 R7　商工会議所推薦企業限定のＣＧＵ学内企業セミナー開催 R8　①「多治見で働こプロジェクト」へＣＧＵ学生参加 ②商工会議所推薦企業限定ＣＧＵ学内企業セミナー継続開催 R9　継続実施	企画政策課
23	**ＣＧＵ企業後援会の設立支援** 地域におけるＣＧＵ認知度向上及び産学官連携による人財定着のため、企業後援会の設立を支援します。 R7　設立準備会の立上げ及び企業後援会の内容検討 R8　①設立準備会による企業後援会の内容検討 ②企業後援会の設立	企画政策課

6 留学生受入れによる国際交流・多文化共生の推進

ＣＧＵは、語学に優れた優秀な留学生の獲得方針を示しています。留学生にとって住みやすく、国際色豊かな調和したまちづくりを行います。

No	事業名称／事業内容／年次計画	担当課
24	**外国人コミュニティ形成に向けたイベントの実施** ＣＧＵ留学生の本市へのスムーズな溶け込みを視野に、国際交流協会と連携し、外国人コミュニティの形成に向けた交流イベントを実施します。 R7　日帰りキャンプ、いちご狩りイベント実施 R8　①イベント継続実施 ②新規企画の立案・実施 R9　継続実施	くらし人権課
25	**外国人留学生の受入れ体制の構築** 本市に在住するＣＧＵ留学生の生活支援を実施するとともに、国際交流協会と連携し、地域住民との交流機会を創出します。 R7　実施内容の検討・調整 R8　①外国人向け生活ガイドブック作成 ②地域住民との交流事業実施 R9　継続実施	くらし人権課

４ 本プラン事業の進捗管理

本プランの各事業は、当市とＣＧＵの担当が連携・調整して実行します。

当市における進捗管理や全体調整は、「中京学院大学プロジェクトＭＴＧ」（所管：企画政策課）において行います。また、ＣＧＵ（所管：多治見移転一元化プロジェクト事務局）と定期的に進捗の共有を行います。

作成：企画部企画政策課
